MONITORAGGIO
METEO IDROLOGICO E IDRAULICO IN CORSO DI EVENTO

DOCUMENTO N.	DATA EMISSIONE	INIZIO VALIDITA'	FINE VALIDITA'
ULTIMO 001/2026/09	15/11/2026 13:37	15/11/2026 14:00	16/11/2026 00:00

PREVISIONE METEOROLOGICA PER LE PROSSIME ORE




LEGENDA PREVISIONE

- Pioggia trascurabile (<2 mm / 6h)
- Pioggia debole (5-10 mm / 6h)
- Pioggia moderata (10-30 mm / 6h)
- Pioggia elevata (>30 mm / 6h)
- Pioggia mista a neve
- Neve

Per le prossime ore sono peviste deboli precipitazioni sparse.
La piena del fiume Reno è in progressivo esaurimento lungo il tratto vallivo con livelli inferiori alla soglia 2.

PIOGGIA OSSERVATA NELLE ULTIME 6 ORE

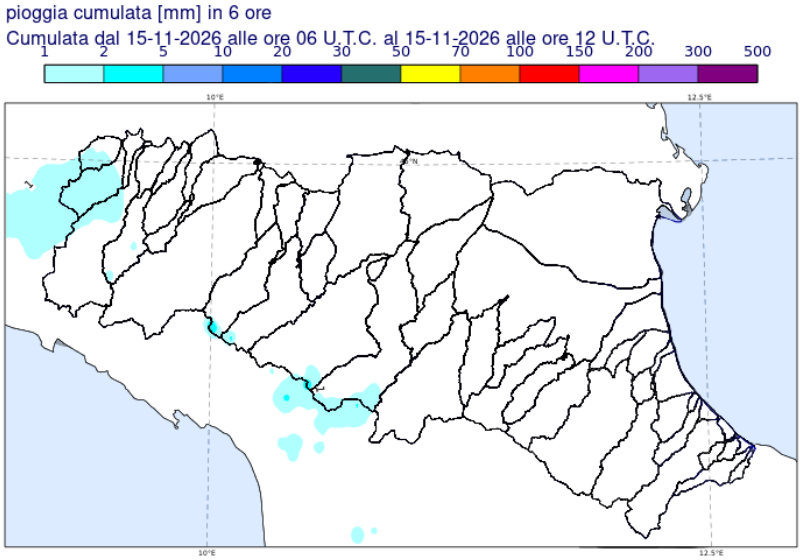

PREVISIONI DELLE PIENE SUI CORSI D'ACQUA MAGGIORI

BACINO RENO										
STAZIONE IDROMETRICA		LIVELLO OSSERVATO			COLMO			SOGLIE RIF.		
		ORE	LIVELLO	Δ	LIVELLO	GG	HH	1	2	3
RENO	Cento	13:00	3.64	▼	**7.17**	**14/11**	**7:45**	5.5	7.0	8.7
RENO	Gallo	13:00	9.76	▼	**10.91**	**14/11**	**17:45**	9.3	12.0	13.7
RENO	Gandazzolo Reno	13:00	14.12	▼	**14.86**	**14/11**	**20:00**	12.5	14.8	17.0

Note: La manovra di apertura del Cavo Napoleonico, iniziata alle 15:30 circa del 13/11, è terminata alle 00:00 circa del 15/11.
La piena del fiume Reno è in progressivo esaurimento lungo il tratto vallivo con livelli inferiori alla soglia 2.

Tutti gli orari sono riferiti all'ora locale.
I dati indicati in grassetto si riferiscono ai livelli al colmo osservati.

Fascia oraria

0:00	6:00	notte
3:00	9:00	notte/matt
6:00	12:00	mattina
9:00	15:00	matt/pom
12:00	18:00	pomeriggio
15:00	21:00	pom/sera
18:00	0:00	sera
21:00	3:00	sera/notte

Δ - Tendenza

▲ in aumento

= stazionaria

▼ in diminuzione

Il Dirigente Referente Centro Funzionale

Pier Paolo Alberoni

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, c.2, D.Lgs. 12/02/1993, n.39
